山东国金化工有限公司

生产厂房建设项目

节能验收报告

建设单位：山东国金化工有限公司

验收单位：淄博博远工程咨询管理有限公司

2026年11月10日

承诺书

我单位承诺《生产厂房建设项目节能验收报告》中所有内容均与本项目实际建设情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担全部法律责任。

特此承诺！

项目建设单位（盖章）：

项目建设单位负责人（签章）：

日期：

目 录

一、资料筹备和验收组组成情况.....1
（一）资料筹备情况.....1
（二）验收组组成情况.....2
二、项目建设单位概况.....4
三、项目建设进展.....4
（一）项目名称.....5
（二）建设地点.....5
（三）项目性质.....5
（四）建设规模及内容.....6
（五）工程进展情况.....6
四、项目建设方案.....6
（一）项目实际建设情况.....6
（二）工艺方案.....7
（三）总平面布置.....7
（四）用能方案的落实情况.....8
五、主要用能设备及其能效水平.....11
六、节能措施.....13
七、计量器具配备.....17
八、项目年综合能源消费量.....19
九、项目能效水平.....21
十、项目碳排放评价.....21
十一、结论和问题.....22
十二、附件.....24

一、资料筹备和验收组组成情况

（一）资料筹备情况

为积极响应国家“碳达峰”的号召，节约能源消耗，确保公司健康发展，加强项目节能审查闭环管理，根据《中华人民共和国节约能源法》《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2023年第2号令）、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（鲁发改环资〔2023〕461号）等文件要求，淄博博远工程咨询管理有限公司成立节能验收工作组，对《生产厂房建设项目》进行了节能验收。

验收组按照节能验收工作计划开展节能验收工作。验收组研究搜集了节能相关政策文件、项目不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺、项目建设情况和设备资料、试生产资料企业基本信息和节能管理制度文件等。项目节能验收的主要依据如下：

1、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2023年第2号令）；

2、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（鲁发改环资〔2023〕461号）；

3、《固定资产投资项目节能审查系列工作指南》（2018年本）；

4、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）；

5、《节能监测技术通则》（GB/T15316-2009）；

6、《重点用能单位能源计量审查规范》（JJF1356-2012);

7、《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委2018年第15号令）；

8、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；

9、《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T12723-2013）；

10、《山东省固定资产投资项目节能验收管理办法（试行）》；

11、山东省建设项目备案证明;

12、项目不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺;

13、项目节能措施和企业节能管理制度;

14、项目节能验收基础资料和承诺书;

15、其他相关文件、资料等。

（二）验收组组成情况

1、验收组人员组成

淄博博远工程咨询管理有限公司组织相关专业的高级工程师、工程师成立节能验收工作组，对《生产厂房建设项目》进行了节能验收，验收组成员及分工如下:

节能验收组成员表

验收工作步骤	时间	参验人员	部门/岗位	验收内容
启动会议	9:00-9:30	刘长海 李世兵 宋洪榕	能评验收组专家	1 验收组成员和验收工作背景介绍； 2 受验收方参会人员和企业基本情况介绍； 3 验收工作范围、依据、程序、原则、日程安排介绍； 4 交流沟通。
文件审查	9:30-10:00	张　涛 李　飞 何玉磊	建设单位负责人及管理人员	1 受验收方组织管理结构，节能报告及管理职责设置； 2 受验收方项目主要生产工艺和设备设施情况等； 3 受验收方项目试生产情况； 4 受验收方项目的建设规模和内容； 5 技术资料及生产统计数据的管理； 6 核算方法、综合能源消费量及能效指标计算的验收。
走访现场	10:00-10:20			现场勘查项目实际情况
验收组内部总结	10:20-10:40			内部总结验收发现情况
末次会议	10:40-11:00			1 与受验收方沟通验收情况； 2 确认后续工作事宜。

2、验收工作方案

本次项目节能验收范围为：项目实际建设规模及建设内容、产品及产量、建设方案、生产用能工艺、主要用能设备、能源计量器具等；项目节能技术和管理措施实施情况；项目能源消费结构、能源消费量及能效水平。

本次节能验收工作由淄博博远工程咨询管理有限公司组织相关专家成立节能验收工作组，验收组收到淄博博远工程咨询管理有限公司关于《山东国金化工有限公司生产厂房建

设项目》的节能验收基础资料，经初步审核，符合节能现场验收条件，于2026年10月21日组织验收组专家现场验收。现场验收期间，验收组与企业能源管理及生产技术人员交流项目建设及试运行情况，查验了相关资料，查看了生产现场、主要用能设备以及能源计量器具等。现场验收后，根据验收要求，山东国金化工有限公司补充完善了相关数据和资料，经验收人员进一步复审和核实，最终形成验收报告。

二、项目建设单位概况

项目单位名称：山东国金化工有限公司

法定代表人：寇亮

项目联系人：罗东

联系方式：13853381420

山东国金化工有限公司成立于2000年9月15日，注册地位于桓台县马桥镇大成工业区。企业经营范围包括：许可项目:危险化学品生产;危险废物经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品):合成材料销售:合成材料制造(不含危险化学品);塑料制品销售;塑料制品制造;石灰和石膏销售;石灰和石膏制造;金银制品销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):第三类非药品类易制毒化学品生产;煤炭及制品销售:五金产品批发:非食用盐销售:食品添加剂

销售:第三类非药品类易制毒化学品经营:固体废物治理;非金属废料和碎屑加工处理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

山东国金化工有限公司为山东博汇集团有限公司的全资子公司，原名为山东桓台博汇社会福利化工厂。该公司注册成立于2000年9月15日，法定代表人为寇亮，注册资本为5100万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址位于山东省淄博市桓台县马桥镇大成工业区。山东国金化工有限公司现有员工50人，设置安全部负责公司的安全生产管理工作，配备安全总监1人、专职安全生产管理人员2人，已取得山东省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（鲁）WH安许证字〔2026〕030013号，经营许可范围为75%硫酸3450吨/年、氯106500吨/年、氢氧化钠溶液[含量≥30%]120000吨/年(折百)、氢3000吨/年、次氯酸钠溶液[含有效氯>8%]1500吨/年、31%盐酸15000吨/年;中间产品:31%盐酸3000吨/年。

三、项目建设进展

（一）项目名称

生产厂房建设项目

（二）建设地点

桓台马桥化工产业园山东国金化工有限公司现有厂区内。

（三）项目性质

本项目属于新建项目。项目所属行业为《国民经济行业分类（GB/T 4754-2019）“E4790小类“其他房屋建筑业””。

（四）建设规模及内容

项目总投资1222.38万元，项目规划占地面积1200平方米，在山东国金化工有限公司现有厂区内建设，不新增占地面积。主要建设内容为新建生产厂房1座，面积为1766平方米，地上4层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构。

经现场查看，项目建设内容与项目节能基本一致，主要用能设备为厂房照明设备。项目由山东国金化工有限公司建设，项目实际建设与批复基本一致。

（五）工程进展情况

项目于2025年4月1日取得山东省建设项目备案证明（2504-370321-89-01-357505）。

项目于2025年3月25日进行不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺。

项目实际开工时间为2026年2月26日开始进行建设，2026年10月10日完工。

四、项目建设方案

（一）项目实际建设情况

主要建设内容为新建生产厂房1座，面积为1766平方米，地上4层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构。

项目工程组成一览表

项目		建设内容	备注
主体工程	生产厂房	建筑面积1766m^2。地上4层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构。	新建
公用工程	供水	本项目用水由市政供水管网提供。	依托
	排水	雨污分流。	依托
	供电	用电由区域电网统一提供。	依托

经现场勘查和查阅资料，项目现场实际建设情况与《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》基本一致。

（二）工艺方案

原料为原盐，经过北侧的化盐池，变为盐水，经管道进入盐水精制厂房，后经管道运输至下一工序。本厂房内不涉及原料产品等的储存。

经现场勘查和查阅资料，项目现场生产工艺与《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》基本一致。

（三）总平面布置

《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》中的总平面布置如下：

本项目位于山东国金化工有限公司厂区内。系对厂区原有盐水精制厂房拆除后，于其原址进行重建。消防设施、行政办公设施等利用厂内原有设施。原有盐水精制厂房位于厂区北侧，东侧为空地。南侧为原有室外设备区，上述设备利旧。西侧为一期一次盐水及原盐储运（戊类），目前属于停运状态。北侧为原有盐棚（戊类）。

该项目配套齐全，水、电等公用工程配套设施齐全，能够保障项目各项用能的需求。项目位置交通便利，有利于项目的建设实施。

经现场勘查和查阅资料，总平面布置情况与《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》基本一致。

（四）用能方案的落实情况

经现场查验，企业已签订了能源供应合同。项目用能方案已落实。

通过对项目进行现场勘验、查阅资料，验收组认为项目建设方案可满足生产需要，项目总平面布置方案、工艺方案、主要用能工序及辅助和附属生产工序、用能方案的落实情况、能源实际接入情况与《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》描述基本一致，基本达到节能审查意见要求。项目建设方案验收情况如下表：

项目建设方案对比表

工艺方案/用能系统（工序/环节）名称	节能承诺	实际实施情况	落实情况自评
规模及建设内容	建筑面积 1766m^2。地上 4 层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构	建筑面积 1766m^2。地上 4 层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构	规模及建设内容基本一致。
总平面布置	该项目配套齐全，水、电等公用工程配套设施齐全，能够保障项目各项用能的需求。项目位置交通便利，有利于项目的建设实施	该项目配套齐全，水、电等公用工程配套设施齐全，能够保障项目各项用能的需求。项目位置交通便利，有利于项目的建设实施	总平面布置基本一致
主要生产工艺和建设方案	不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰落后工艺。	不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰落后工艺	工艺和建设方案基本一致

辅助生产和附属生产设施建设方案	项目给排水系统、“三废”处理、照明系统按照要求建设。	项目给排水系统、“三废”处理、照明系统按照要求建设。	照明设施基本符合节能审查方案

五、主要用能设备及其能效水平

根据《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》，项目未列明主要耗能设备，项目主要耗能设备。

项目实施情况主要设备一览表如下：

项目用能设备台账

序号	设备名称	功率 kW	能效等级	设备数量	运行数量	备用数量	电压等级
1	三防壁灯	0.06	二级	26	26	0	220V
2	三防平台灯	0.06	二级	22	22	0	220V
3	三防投光灯	0.1	二级	9	9	0	220V
4	双管荧光灯	2*0.04	二级	5	5	0	220V
5	单管荧光灯	0.04	二级	8	8	0	220V

验收组对项目现场主要用能设备的型号、数量、能效进行了查验，建设单位用能设备明细表齐全，现场未发现国家明令淘汰的用能设备。验收组认为项目用能设备与节能承诺要求基本一致。

用能设备验收表

工艺/用能系统	设备名称	安装地点	节能审查要求		实施情况		落实情况
			型号参数	数量	型号参数	数量	
主要生产设备	三防壁灯、三防平台灯	车间	/	/	GLD210-60W	48（台）	建设单位用能设备明细表齐全，现场未发现国家明令淘汰的用能设备。验收组认为项目用能设备与节能承诺要求基本一致。
	三防投光灯		/	/	GLD8550-80W	9（台）	
	双管荧光灯		/	/	YG2-2x40W	5（台）	
	单管荧光灯		/	/	YG1-1-40W	8（台）	

六、节能措施

验收组根据项目节能审查阶段提出的各项节能技术和管理措施，审核了项目设计技术资料，核实了项目的节能技术措施和能源管理机构、制度建设等情况。

验收发现：项目工艺及设备节能、节水、节电和总图布置等节能措施基本落实了节能审查阶段的节能措施，节能管理措施基本完善，符合《能源管理体系要求及使用指南》GB/T23331-2020）、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）等要求。

节能措施落实情况对比表

内容	序号	节能审查要求	实际实施情况	落实情况自评
节能技术措施	1	本项目生产过程不涉及耗能。	本项目生产过程不涉及耗能。	/
设备节能措施	1	/	本项目所用照明设备均为节能灯具。	基本一致
总图运输节能措施	1	项目不涉及。	项目不涉及。	/
节能管理措施	1	制定《能源节约管理制度》 落实企业能源管理制度，明确能源管理职责，制定能源利用全过程的管理要求或规范，确立淘汰落后、实施节能技术改造及奖惩等各方面管理机制，加强节能管理，减少能源损失，提高能源利用效率。每年制定并实施节能计划和节能措施，确保完成能耗总量控制和节能目标。	项目运行期间严格按照厂区节能制度和要求落实好相关工作。 公司设立能源管理课，下设能源管理岗、计量管理岗；建立能源管理制度、能源计量管理制度、能源计量器具管理制度。 公司成立节能工作领导小组，全面负责企业的节能管理工作，指标分解结合定额管理与标杆对标，以能源计量和统计台账为考核提供数据基础，制定了能耗目标考核办法。 公司能源计量管理严格遵循《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）等法规标准，按要求	基本一致
	2	建立节能组织及管理机构		
		企业成立项目节能领导小组，节能领导小组全面负责企业的节能管理工作，在节能领导小组的领导下形成公司、车间、班组的三级节能管理网络体系。建立节能目标责任制，建立节能奖惩制度。		

	3	加强能源计量管理 根据《计量法》和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）的规定及项目用能情况，进行能源计量装置的配备和管理。	配置计量器具，建立健全计量管理体系与台账，定期开展检定。 公司定期开展能源消耗状况分析，掌握影响能耗因素及其变化规律，挖掘节能潜力及改进机会，提出节能技术改进项目与优化建议； 公司建立能源管控中心，实现各用能单位、主要耗能设备和工序实际用能量实时上传监控。 建立主要耗能设备台账，规避国家明令禁止的高耗低效设备使用，设备更换及新建项目设备选型符合项目规范要求。 公司定期开展能源审计、节能诊断、水平衡测试等工作，并将相关报告报送地方政府主管部门。 公司定期组织各用能部门车间或班组的计量、主要耗能设备岗位操作人员、统计人员开展节能知识培训，提高员工节能技术水平。 制定年度能源培训计划(含能源管理体系标准、认证标准、法规、运行规程)。建立培训档案，内容包括：培训计划、培训签到表、培训试题等。	
	4	加强能源统计管理 按照国家有关规定设置原始记录、统计台账，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度。统计资料的审核、签署人员对其审核、签署的统计资料的真实性、准确性和完整性负责。能源统计的主要工作包括能源购进和消耗汇总、能源统计报表、统计数据、能源消耗原始凭证管理等，通过能源统计分析能源消耗、节能指标的完成情况，加强节能管理。		
	5	加强能源监测 建设能源管理信息化平台，加强能源计量基础能力建设，按照政府管理节能工作的部门、质量技术监督部门要求建设能耗在线监测系统，提升能源管理信息化水平。节能管理部门及专职节能管理员要监测、检查节能制度落实情况、计量器具配备、能源计量器具检定、校准、能耗限额落实情况，重点监测主要用能设备，发现能耗超标要查明原因，进行改进，使其达到正常的能耗指标，保证节能措施的落实。		
	6	加强重点用能设备节能 加强重点设备的用能工艺改进，经常关注生产过程中能耗的变化，大力推进节能工艺的进步。按照国家有关规定实施能源审计，分析现状，查找问题，挖掘节能潜力，提出切实可行的节能措施，并向县级以上人民政府管理节能工作的部门报送能源审计报告。		

	7	加强节能宣传好培训 加强对员工进行节能降耗教育，增强员工厉行节约，杜绝浪费的意识。经常性组织内部检查和考核工作，各部门车间负责人是节能降耗第一责任人。增强企业全体职工的节能意识好自觉性。进行节能信息交流，积极应用节能新技术、新工艺。		

七、计量器具配备

根据《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》，项目未要求设置能源计量器具。

项目实施情况未设置能源计量器具，通过现场进行实地查验，项目与《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》内容基本一致，验收组认为项目能源计量器具配备基本符合标准要求。

计量器具配备落实情况对比表

能源种类	节能审查/标准要求配备率			实际配备率			落实情况自评
	用能单位	主次级用能单位	主要用能设备	用能单位	主次级用能单位	主要用能设备	
/	/	/	/	/	/	/	基本落实标准要求

八、项目年综合能源消费量

根据项目节能承诺：该项目建成后年综合能源消耗量应控制在2.23tce标准煤以内。该项目使用的主要能源为二次能源电，电力年消耗量1.82万kWh，年综合能源消费量当量值为2.23tce（等价值5.49tce）。

根据项目用能设备功率和日常运行情况折算，本项目照明系统年综合运行时间约4000h，年电能消耗量约为18000kWh，年综合能源消费量当量值为2.21tce（等价值5.43tce）。

验收发现：

1、项目能源消费品种未发生变化。

2、按照试生产数据折合完全达产时消耗量，电力消耗少量减少，原因为采用了节能灯具，降低了能耗。项目能源消费量满足节能审查要求。

项目能源消费量情况表

名称	能源消费种类	计量单位	节能审查批复值			实际消费量（折合满产时）		
			实物量	折标系数	折标准煤	实物量	折标系数	折标准煤
输入	电力	万kwh	1.82	0.1229kgce/kWh当量值	2.23	1.80	0.1229kgce/kWh当量值	2.21
				0.3015kgce/kWh等价值	5.49		0.3015kgce/kWh等价值	5.43
输出	/	/	/	/	/	/	/	/
综合能源消费量			当量值	2.23		当量值	2.21	
			等价值	5.49		等价值	5.43	

九、项目能效水平

根据该项目《不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺》：依据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)，项目投产后年耗电量为1.82万kWh，能耗为2.23吨标准煤。

验收组根据项目用能设备功率和日常运行情况，核算了项目能效指标，年新增综合能耗量为2.21吨标准煤，优于节能审查要求。

十、项目碳排放评价

根据项目不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺的内容，项目未开展碳排放评价工作，此次验收不涉及碳排放情况和减碳措施落实情况的验收。

十一、结论和问题

验收组成员对山东国金化工有限公司生产厂房建设项目进行了实地勘察，对项目工艺、技术、设备、用能等情况进行认真地研究和分析，另对公司项目的用能总量进行了计算。

经现场查看，项目建设内容与项目节能审查意见基本一致。

项目用能设备明细表齐全，生产用能设备总数与节能承诺材料基本一致。现场未发现国家明令淘汰的用能设备。

项目工艺及设备节能、电气等节能措施基本落实了节能要求。节能管理措施较完善。

经过收集相关资料，按照《中华人民共和国节约能源法》《山东省节约能源条例》《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年第2号）、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》（鲁发改环资〔2023〕461号）、《山东省固定资产投资项目节能验收管理办法（试行）》（鲁发改环资〔2024〕657号）等有关规定，依据国家相关法律、政策、技术标准和规范，认为山东国金化工有限公司生产厂房建设项目达到了节能验收的条件和要求。

项目能源消费量和能效水平符合节能审核意见要求，实际运行主要耗能种类为电。项目折合达产时年综合能源消费量2.21tce优于节能承诺的2.23tce，满足节能审查要求。

综上，项目各项验收内容均落实和满足节能审查要求，项目节能验收合格。

表11-1 项目节能验收意见表

验收项	验收结果
项目建设方案	合格
主要用能设备及其能效水平	合格
节能技术和管理措施	合格
计量器具配备	合格
年综合能源消费量	合格
项目能效水平	不涉及
碳排放评价	不涉及
验收意见： 经查阅资料、数据核算和现场查验，山东国金化工有限公司生产厂房建设项目的项目建设方案、主要用能设备、节能技术和管理措施、计量器具配置、综合能源消费量、能效指标的验收内容符合节能验收要求，项目节能验收合格。 建设单位（签章） 2026年10月21日	

十二、附件

1、项目的备案证明

山东省建设项目备案证明

项目单位基本情况	单位名称	山东国金化工有限公司		
	法定代表人	寇亮	法人证照号码	91370321723298760A
项目基本情况	项目代码	2504-370321-89-01-357505		
	项目名称	生产厂房建设项目		
	建设地点	桓台县		
	建设规模和内容	项目规划占地面积1200平方米，在山东国金化工有限公司现有厂区内建设，不新增占地面积。主要建设内容为新建生产厂房1座，面积为1766平方米，地上4层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构。		
	建设地点详细地址	桓台马桥化工产业园		
	总投资	1222.38万元	建设起止年限	2025年至2026年
项目负责人	罗东	联系电话	13853381420	

承诺：

山东国金化工有限公司（单位）承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合相关产业政策规定。如存在弄虚作假情况及由此导致的一切后果由本单位承担全部责任。

法定代表人或项目负责人签字：_____

备案时间：2025-4-1

2、不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺

编号：

不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺

（适用于不单独进行节能审查的行业目录外，年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时项目）

我单位拟建设山东国金化工有限公司生产厂房建设项目，建设起止时间计划于2025年7月至2026年2月，建设期8个月。

1.主要建设规模：

项目总投资1222.38万元，资金来源：企业自筹解决。

2.建设内容：

项目规划总占地面积1200平方米，在山东国金化工有限公司现有厂区内建设，不新增占地面积。主要建设内容为生产厂房1座，地上4层，混凝土结构。配套建设化盐池、反应池及缓冲池等，为地下混凝土结构。

依据《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)，项目投产后年用电量1.82万千瓦时，年综合能耗2.23吨标准煤。

项目按照《国家发展改革委关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》(发改环资规〔2017〕1975号)要求，可不编制单独的节能报告，已在项目申请报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析。

1

我单位承诺项目按照相关节能标准、规范建设，采用节能技术、工艺和设备，加强节能管理，不断提高项目能效水平。项目实施建设和运营期，将严格遵守国家相关节能法律法规政策，自觉配合相关检查、监察。

项目联系人：罗　东　　联系电话：13853381420

建设单位负责人(签字)：

建设单位（盖章）：　山东国金化工有限公司

2025 年 3 月 25 日



统一社会信用代码

91370321723298760A

营业执照

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　山东国金化工有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人　寇亮

经营范围　许可项目：危险化学品生产；危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；塑料制品制造；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；金银制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；煤炭及制品销售；五金产品批发；非食用盐销售；食品添加剂销售；第三类非药品类易制毒化学品经营；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　叁佰万元整

成立日期　2000 年 09 月 15 日

住　　所　山东省淄博市桓台县马桥镇大成工业区

登记机关　桓台县行政审批服务局

2023 年 07 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

4、项目地理位置图


小清河
小清河
本项目位置
朋博饭店旅
金家
山东金诚石化
集团有限公司
胜利河
胜利河
张吉记小碗菜
大成路
大成路
大成路
大成路

5、项目平面布置图

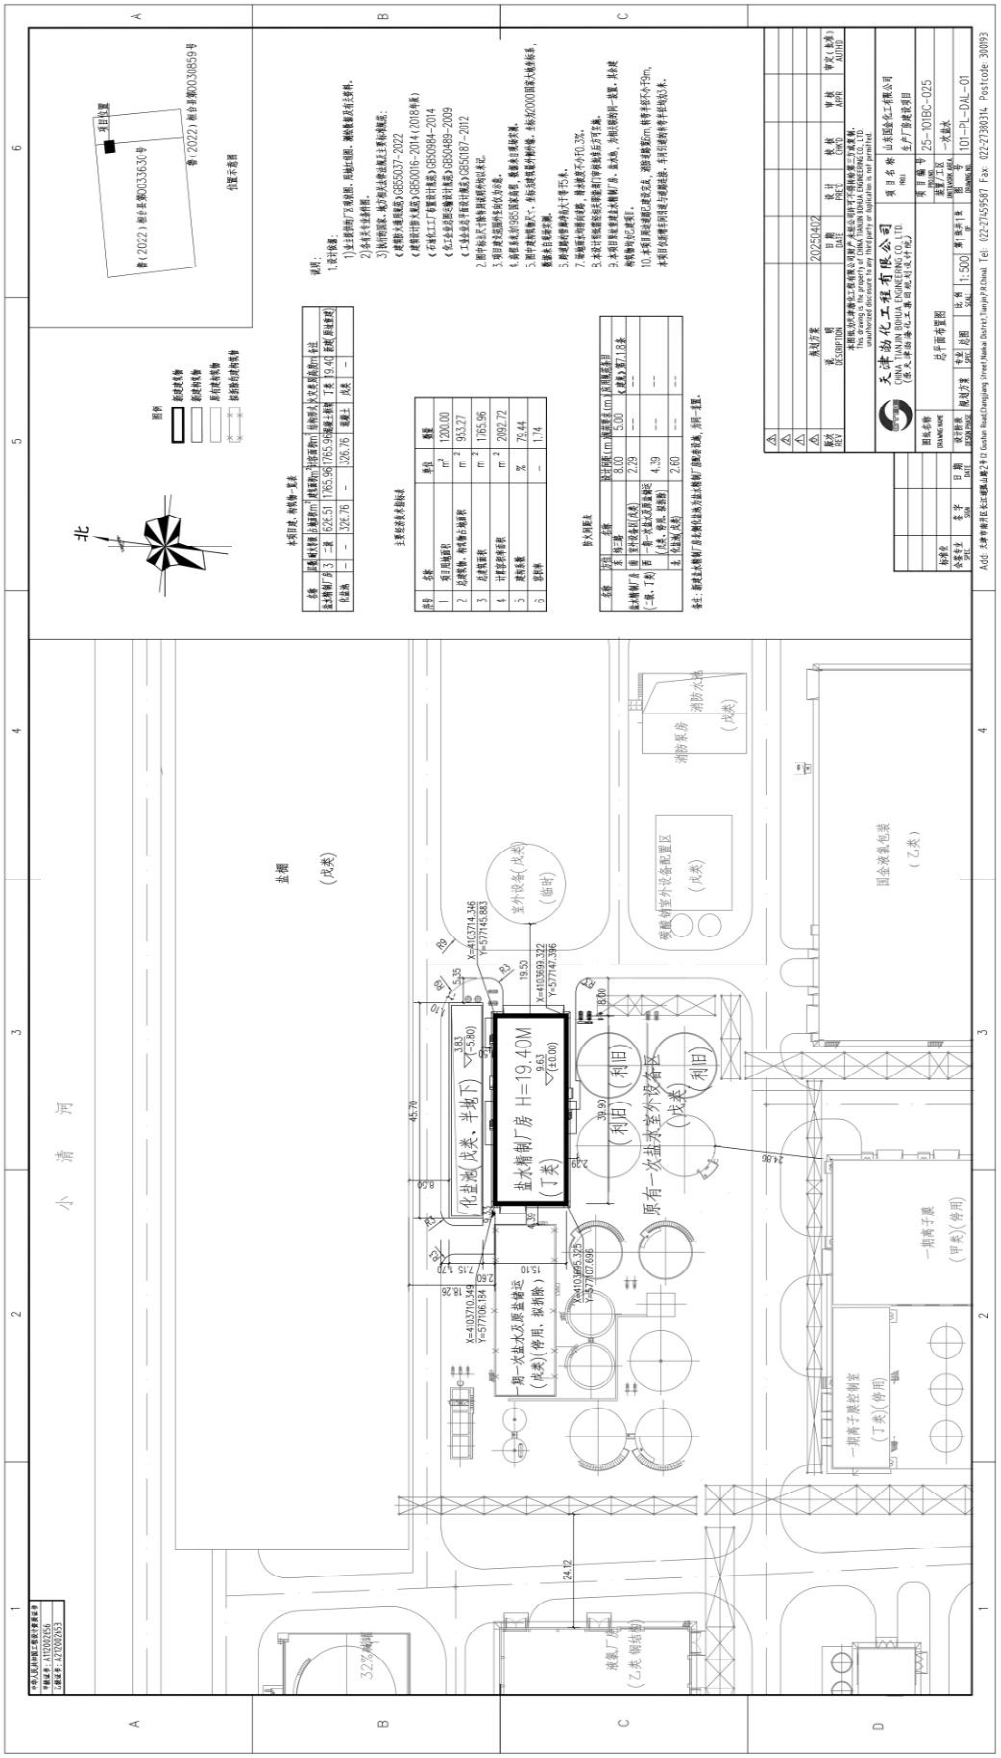
盐棚
(戊类)
小 清 河
盐水精制厂房 H=19.40M
(丁类)
化盐池(戊类、半地下)
原有一次盐水及废盐水输送
(戊类)(停用、拟拆除)
原有一次盐水室外设备区
(戊类)
(利旧)
(利旧)
(利旧)
室外设备(戊类)
(临时)
消防泵房
(戊类)
消防水池
(戊类)
带酸碱室外设备配置区
(戊类)
固态液氯包装
(乙类)
一期离子膜
(甲类)(停用)
一期离子膜控制室
(丁类)(停用)
液氯厂房
(乙类 钢结构)
32米高烟囱
北
项目位置
鲁(2022)塘沽不动产权第0330859号
鲁(2022)塘沽不动产权第0330630号
位置示意图
图例
新建设备
新建构筑物
原有建构筑物
拟拆除构筑物
水系统设备、构筑物一览表
主要经济技术指标表
防火间距表
说明:
1.设计依据:
1)业主提供的厂区总图、现场红线图、测绘数据及有关资料。
2)各专业设计资料。
3)标准规范:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))
《石油化工厂可燃气体探测报警设计规范》(GB50493-2009)
《化工企业总平面设计规范》(GB50489-2009)
《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)
2.图中标注尺寸除特别说明外均以米计。
3.图中未注圆角半径均为5米。
4.道路转弯半径均按5米设置。
5.图中高程为1985国家高程。
6.图中未标注的管线尺寸、转弯半径均为4000,其他转角,
按建筑自身设计要求。
7.图中标注的坐标为大于等于5米。
8.图中标注的标高为大于等于5米。
9.本设计依据现状总平面图进行设计,现状总平面图为2019年测绘。
10.本项目总图设计已考虑了与周边企业、道路、铁路、管线等的关系,
本项目总图设计与周边企业、道路、铁路、管线等的关系协调一致。
天津渤化工程有限公司
CHINA TIANJIN BOHUA ENGINEERING CO., LTD
(原天津渤海化工集团有限公司)
山东国信化工有限公司
年产7万吨离子膜烧碱项目
总平面布置图
25-101BC-025
一次盐水
101-21-DAL-01
1:500
2022.04
Add:天津市滨海新区汉沽盐场山路2号 Post code:300093 Tel:(022-27559587 Fax:(022-27390314

6、项目建成后外观照片





7、现场部分设备照片（补充照明设备）

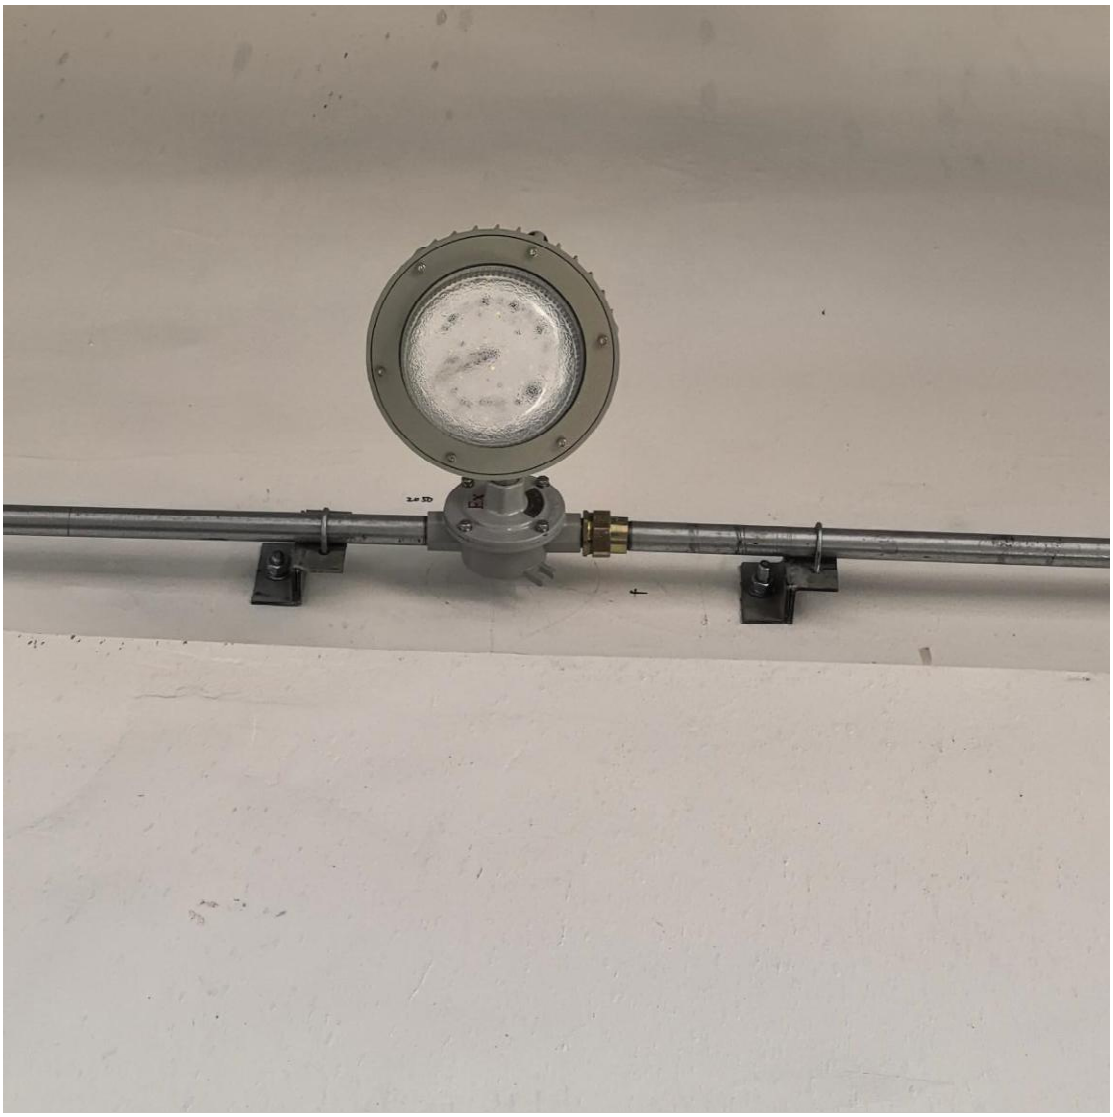

三防壁灯



三防平台灯



三防泛光灯

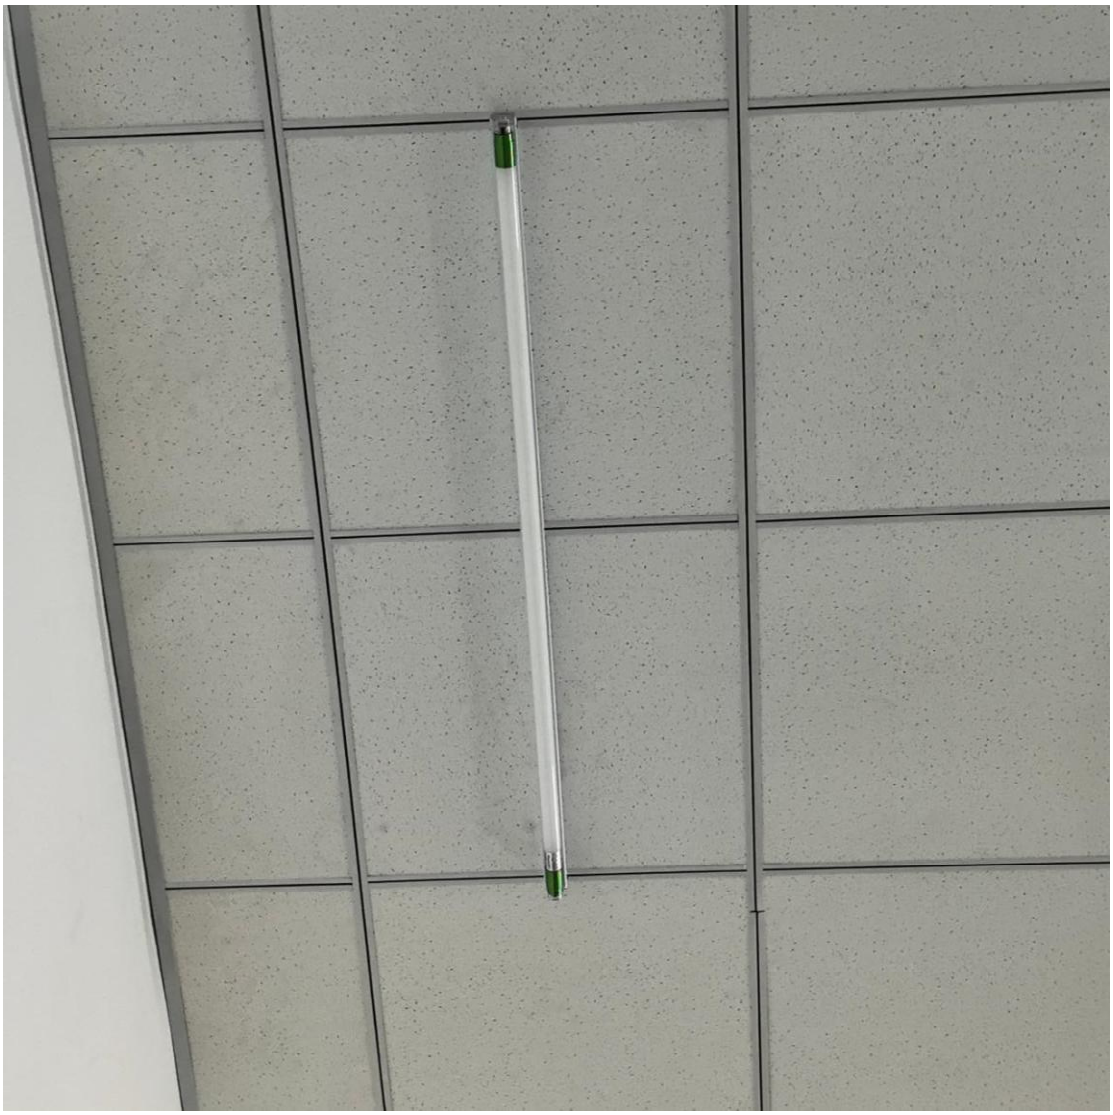

单管荧光灯



双管荧光灯
